



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИСАиИ
О.С. Логунова

11.02.2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки
08.03.01 Строительство

Направленность (профиль/специализация) программы
Технология, материалы и организация промышленного и гражданского строительства

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Институт строительства, архитектуры и искусства
Кафедра	Проектирования и строительства зданий
Курс	3, 4
Семестр	6, 7, 8

Магнитогорск
2022 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Проектирования и строительства зданий
10.02.2022, протокол № 5

Зав. кафедрой  В.Б. Гаврилов

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИСАиИ
11.02.2022 г. протокол № 4

Председатель  О.С. Логунова

Рабочая программа составлена:
ст. преподаватель кафедры ПиСЗ

 И.С. Трубкин

Рецензент:
Главный инженер ООО "МСБ-Инжиниринг",
канд. техн. наук

 М.В. Нащекин

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Проектирования и строительства зданий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Проектирования и строительства зданий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Проектирования и строительства зданий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Проектирования и строительства зданий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Проектная деятельность» является подготовка квалифицированных специалистов – организаторов строительного производства, знающих теоретические основы технологии строительного производства, организации, планирования и управления в строительстве и умеющих их эффективно использовать в практической деятельности.

Задачи дисциплины «Проектная деятельность»:

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Проектная деятельность»;
- раскрыть понятийный аппарат дисциплины;
- сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора технических средств;
- сформировать умение владеть типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;
- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения;
- сформировать навыки разработки технико-экономического обоснование проектных расчетов, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченные проектно-конструкторских работ;
- сформировать навыки освоения методов контроля, соответствия разрабатываемых проектов техническому заданию, доводки и освоения технологических процессов строительного производства, предварительного технико-экономического обоснование проектных расчетов, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления законченные проект-но-конструкторских работ;
- сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;
- сформировать способность вести организацию менеджмента качества, и методов контроля качества технологических процессов на производственных участках.

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом и при самостоятельной работе с учебной и технической литературой.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Проектная деятельность входит в обязательную часть учебного плана образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Производственная - исполнительская практика

Строительные машины и оборудование

Технология возведения зданий

Архитектура зданий

Основы организации строительного производства

Технологические процессы в строительстве

Безопасность жизнедеятельности

Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)

Основы архитектуры и строительных конструкций

Строительные материалы

Учебная - ознакомительная практика

Учебная - изыскательская практика

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Организация, планирование и управление в строительстве

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Спецкурс по технологии строительства

Производственная - преддипломная практика

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1	Определяет круг задач в рамках поставленной цели и предлагает способы их решения и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
УК-2.2	Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм
УК-2.3	Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1	Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; строит продуктивное взаимодействие с учетом норм и установленных правил командной работы
УК-3.2	При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитывает особенности поведения и интересы других участников, анализирует возможные последствия личных действий
УК-3.3	Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 86,3 акад. часов;
- аудиторная – 86 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,3 акад. часов;
- самостоятельная работа – 165,7 акад. часов;
- в форме практической подготовки – 8 акад. час;

Форма аттестации - зачет, зачет с оценкой

Раздел/ тема дисциплины	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Раздел 1. Технологические процессы переработки грунта								
1.1 Тематика самостоятельной работы при выполнении проектных работ по индивидуальным заданиям за пятый семестр	6			12	7,1	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуального задания.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Доклад с презентацией. 4. Защита индивидуальных заданий.	УК-2.1
Итого по разделу				12	7,1			
2. Раздел 2. Технологические процессы погружения готовых свай								
2.1 Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на пятый семестр	6			4	2	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуального задания.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Защита индивидуального задания. 4. Зачет.	УК-2.1
Итого по разделу				4	5,9			

3. Раздел 3. Технология изготовления конструкций из монолитного бетона и железобетона									
3.1	Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на шестой семестр	6			5	8	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуального задания.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Доклад с презентацией. 4. Защита индивидуального задания.	УК-2.1
Итого по разделу				5	8				
4. Раздел 4. Технология каменной кладки									
4.1	Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на шестой семестр	6			5	8	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуальных заданий.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Доклад с презентацией. 3. Защита индивидуальных заданий.	УК-2.1
Итого по разделу				5	8				
5. Раздел 5. Технология монтажа строительных конструкций									
5.1	Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на шестой семестр	6			2	11	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуального задания.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Защита индивидуального задания. 4. Зачет.	УК-2.1
Итого по разделу				2	14,9				
Итого за семестр				28	36,1		зачёт		
6. Раздел 6. Вариантное проектирование технологических карт									

6.1 Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на седьмой семестр	7			36	32	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуальных заданий.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Доклад с презентацией. 4. Защита индивидуальных заданий. 5. Зачет.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3
Итого по разделу				36	35,9			
Итого за семестр				36	32		зачёт	
7. Раздел 7. Проектирование объектного и общеплощадочного строительных генеральных планов								
7.1 Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на восьмой семестр	8			22	82	1. Самостоятельное изучение учебной литературы. 2. Работа с электронными библиотеками. 3. Подготовка и выполнение практических занятий. 4. Выполнение индивидуальных заданий.	1. Самоотчет. 2. Консультации. 3. Доклад с презентацией. 4. Защита индивидуальных заданий. 5. Зачет с оценкой.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3
Итого по разделу				22	85,9			
Итого за семестр				22	82		зао	
Итого по дисциплине				86	165,7		зачет, зачет с оценкой	

5 Образовательные технологии

1. Традиционные образовательные технологии, ориентированные на организацию образовательного процесса и предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

При проведении практических занятий используются методы контекстного обучения, которые позволяют усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением, а также опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на практических занятиях и эвристическая беседа, которая путем искусно сформулированных наводящих вопросов побуждает студентов прийти к самостоятельному правильному ответу.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий: семинар-дискуссия – коллективное обсуждение вопросов, проблемы, выявление мнений в группе по теме изучаемого вопроса или технологии.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебник / Б. Ф. Белецкий. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-1256-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/9461> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Вильман Ю.А., Технология строительных процессов и возведения зданий. современные и прогрессивные методы : Учебное пособие / Вильман Ю.А. - 4-е изд., дополненное и переработанное. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-93093-392-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933928.html> (дата обращения: 22.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

2. Возведение монолитных конструкций зданий и сооружений : монография / П. П. Олейник, Б. В. Жадановский, М. Ф. Кужин [и др.] ; под общей редакцией П. П. Олейника. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-7264-1830-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108510> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург :

Лань, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-3050-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/104861> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Рязанова, Г. Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений : учебное пособие / Г. Н. Рязанова, А. Ю. Давиденко. — Самара : АСИ СамГТУ, 2016. — 230 с. — ISBN 978-5-9585-0669-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/90096> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Технология возведения зданий и сооружений : Курс лекций : учебное пособие / составитель М. А. Фетисова. — Орел : ОрелГАУ, 2016. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/91685> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Технология сборного и монолитного бетона и железобетона : учебное пособие / Н. В. Гилязидинова, А. В. Угляница, Т. Н. Санталова, Н. Ю. Рудковская. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 217 с. — ISBN 978-5-906888-34-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105420> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Гилязидинова, Н. В. Технология строительства в зимних условиях : учебное пособие / Н. В. Гилязидинова, А. В. Угляница. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 95 с. — ISBN 978-5-906969-05-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105387> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Белова, Е. М. Управление трудовым коллективом строительного предприятия : учебное пособие / Е. М. Белова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-906969-03-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105382> (дата обращения: 23.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Методические указания:

1. Андреев, В. М. Разработка технологических карт на производство земляных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Андреев, И.С. Трубкин; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2474.pdf&show=dcatalogues/1/1130218/2474.pdf&view=true>. - Макрообъект.

2. Андреев, В.М. Монтаж каркасов одноэтажных промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций [Текст]: метод. указ. для выполнения курсового проекта по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» для студентов спец. 270102 / В.М. Андреев, Ю.В. Большаков, Л.А. Харин, И.С. Трубкин. - Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2009.

3. Андреев, В. М. Монтаж многоэтажных каркасных зданий из сборных железобетонных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Андреев; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2474.pdf&show=dcatalogues/1/1130218/2474.pdf&view=true>. - Макрообъект.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Гранд-Смета, версия Студент	Д-1085-18 от 29.08.2018	бессрочно
Autodesk AutoCAD 2020	учебная версия	бессрочно
Электронные плакаты по дисциплине "Технология строительных процессов"	К-278-11 от 15.07.2011	бессрочно
Браузер Mozilla Firefox	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Браузер Yandex	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»	https://dlib.eastview.com/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: https://scholar.google.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение аудитории: Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. Наглядные материалы.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение аудитории: Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение аудитории: Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации

Приложение 1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных заданий, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения литературы, работа с электронными библиотеками, проработка материала при подготовке к практическим занятиям, выполнения домашних заданий и индивидуальных заданий.

Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на пятый семестр:

Задание 1. Составление исходных данных для проектирования производства земляных работ и расчет вертикальной планировки строительной площадки.

Приступая к выполнению задания, студент должен выписать согласно шифру задания показатели своего варианта и установить или уточнить значения дополнительных показателей. Например, шифр задания 2-3-5- II.

Цифра «2» означает, что площадка имеет размеры в плане 250×150 м. и проектный уклон составляет 0,002.

Цифра «3» означает, что горизонтали имеют следующие значения: А - 71,5 м.; Б - 72,0 м.; В - 72,5 м.; Г - 73,0 м.; Д - 73,5 м.

Цифра «5» означает, что грунт – суглинок с примесью гальки до 10%, плотностью $\gamma = 1700$ кг/м³. Коэффициент откоса – $m = 0,75$, при глубине от 3 до 5 м и $m = 0,5$, при глубине от 1,5 до 3 м. Коэффициент остаточного разрыхления – $k_{op} = 0,05$, первоначального разрыхления $k_{н.р} = 0,24$. Для насыпи $m = 1,5$. Группа грунта по трудности разработки «1» для всех механизмов.

Римская цифра «II» означает вариант схемы площадки. Пример схемы площадки приведен на рисунке П.1.

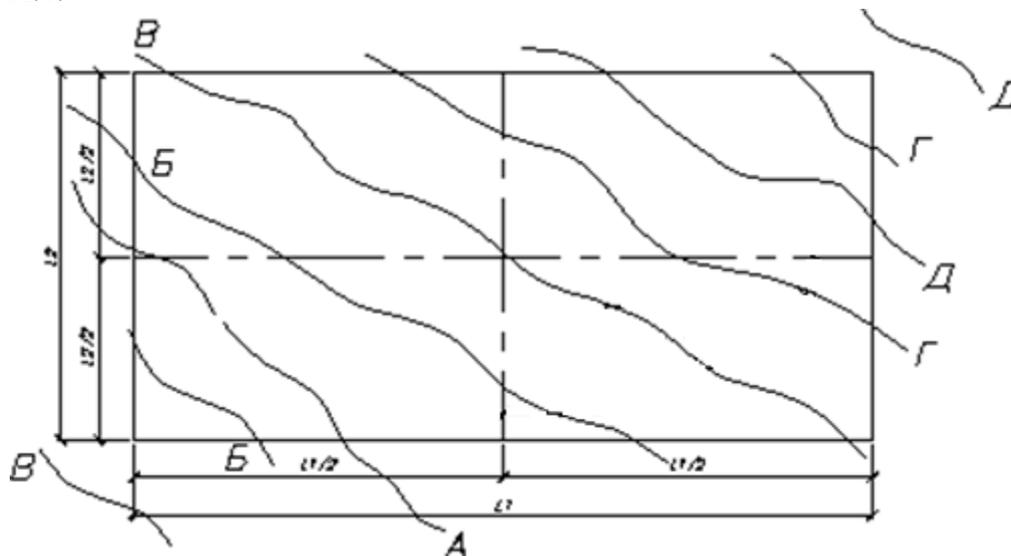


Рисунок П.1 – Схема исходной площадки

Исходные данные свести в таблицу П.1, представленную ниже, которая заполняется полностью.

Таблица П.1 - Исходные данные для выполнения задания

№ п/п	Наименование показателя		Обозначение	Значение показателя	
1	2		3	4	
1	Строительная площадка	длина, м	L_1	250	
		ширина, м	L_2	150	
2	Уклон		i	0,002	
3	Значение горизонталей, м		A	71,5	
			B	72,0	
			B	72,5	
			Γ	73,0	
		D	73,5		
4	Наименование и характеристика грунтов: плотность, кг/м ³		γ	Растительный слой	Суглинок (например)
				1400	1800
5	Группа по трудности разработки:	экскаваторами	-	1	1
		бульдозерами	-	2	1
		скреперами	-	1	1
		вручную	-	2	1
6	Коэффициент откоса		$l:m$	1:1	1:0,75
7	Коэффициент первоначального разрыхления		$K_{н.р.}$	0,22-0,28	0,24-0,30
8	Коэффициент первоначального разрыхления		$K_{о.р.}$	0,05-0,07	0,04-0,07

Произвести планировку площадки для устранения неровности естественного рельефа местности и придания ей заданного проектного уклона. Планировка вести с нулевым балансом земляных масс.

Подсчет объемов планировки вести по методу квадратов. Определить значения черных, красных и рабочих отметок вершин квадратов.

После вычисления рабочих отметок определить положение линии нулевых работ.

Начертить план площадки с нанесенными значениями черных, красных и рабочих значений площадки, с нанесенной линией нулевых работ и проектируемыми откосами. Пример схемы площадки приведен на рисунке П.2.

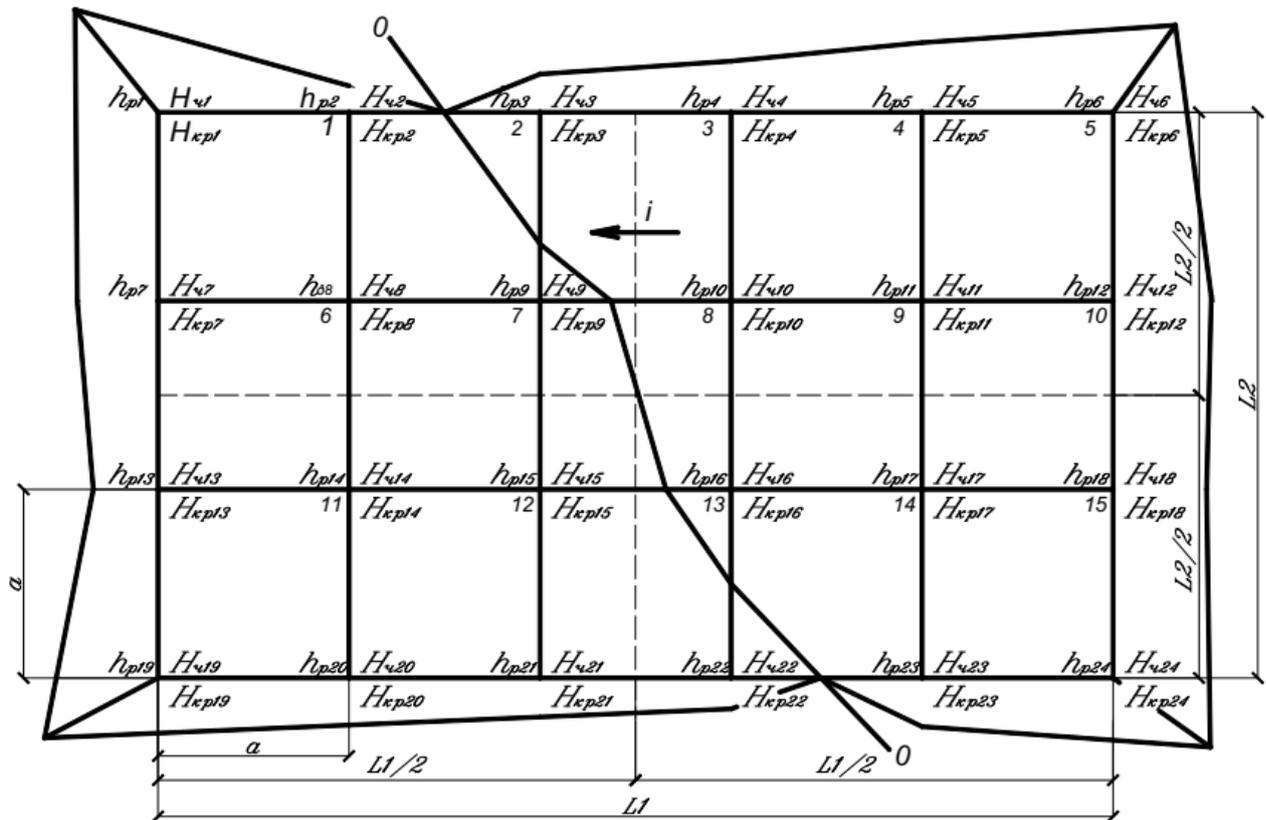


Рисунок П.2 – План площадки с нанесением черных, красных, рабочих отметок и линии нулевых работ

Задание 2. Определить объемы планировочной выемки и насыпи. Подсчет объем грунта в выемке и насыпи производить следующим образом:

- определить объемы в элементарных фигурах (выемки и насыпи);
- определить дополнительные объемы (откосы выемки и насыпи);
- свести объемы земляных масс при планировке площадки в таблицу П.2.

Таблица П.2 - Ведомость объемов насыпей и выемок по квадратам

№ квадрата	Рабочие отметки, м					Средние рабочие отметки, $h_{ср}$	Площадь фигур, м ²	Основные объемы, м ³		Дополнительные объемы (откосы), м ³	Общие объемы, м ³	
	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5			выемка (+)	насыпь (-)		выемка (+)	насыпь (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2а												
2б												
...												
											Σ	Σ

* В графы 2 – 6 рабочие отметки выписываются со своим знаком

Задание 3. Составить баланс земляных масс. С помощью метода решения транспортной задачи линейного программирования определить оптимальное распределение земляных масс в пределах площадки. В качестве критерия оптимальности выбрать дальность перемещения грунта из планировочной выемки в планировочную насыпь и рассчитать такой вариант, в котором эта дальность будет минимальной.

Полученные результаты распределения земляных масс нанести на схему площадки с объемами перемещений (рисунок П.3).

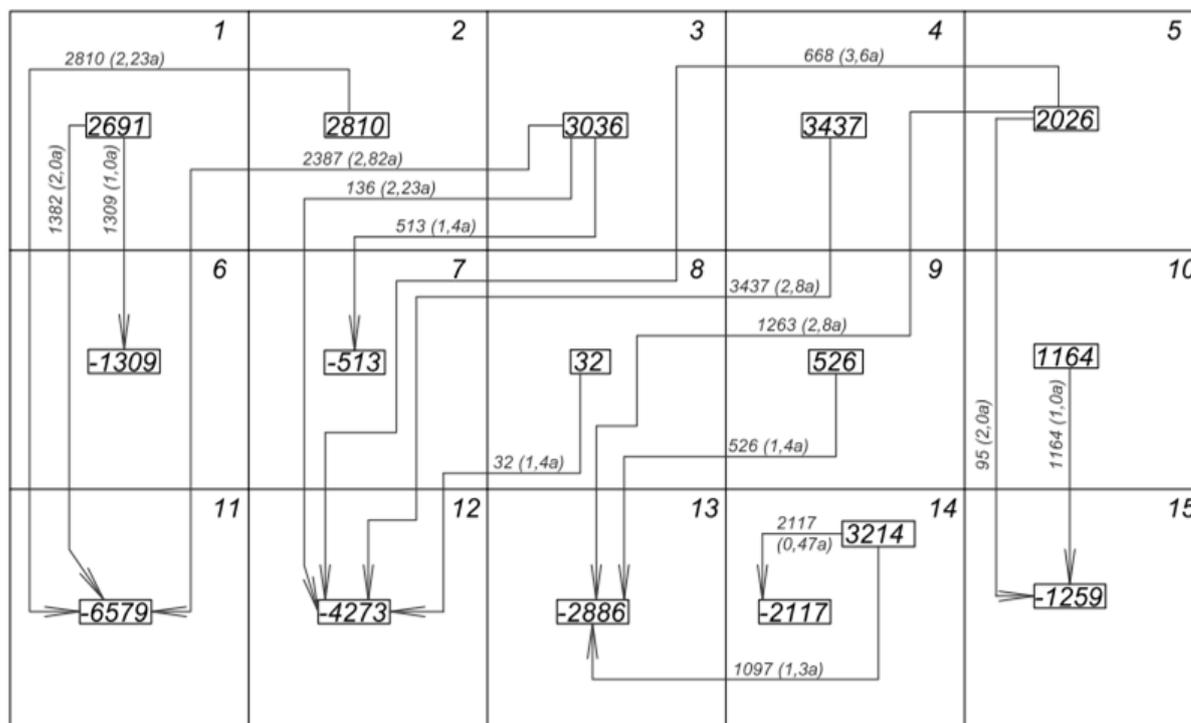


Рисунок П.3 - Картограмма земляных масс

Задание 4. Рассчитать ТЭП и выбрать рациональную область использования бульдозера. Согласно варианту индивидуального задания произвести расчёт основных ТЭП бульдозера, привести циклограмму работы бульдозера, построить графические зависимости $P_{э.ч.} = f(\ell_{mp})$, $N_{уд} = f(\ell_{mp})$, $G_{уд} = f(\ell_{mp})$, определить область рационального использования бульдозера. Пример индивидуального задания: Категория грунта – I. Марка бульдозера – ДЗ-54. Дальность транспортирования грунта: $\ell_{mp} = 30, 60, 90$ и 120 м.

Задание 5. Рассчитать ТЭП и выбрать оптимальный тип экскаватора. Для производства земляных работ комплексно-механизированным способом могут быть использованы экскаваторы: ЭО-2621, ЕК-14; ЭО-4112. Требуется выбрать из них наиболее эффективный экскаватор для разработки грунта в земляных сооружениях различного объёма. Расчёт сравнительной эффективности выбора оптимального типа экскаватора свести в таблицу П.3.

По результатам расчётов построить графики зависимостей приведённых затрат (Z_{np}) от объёмов работ (V) и сделать выбор наиболее эффективного экскаватора. Пример индивидуального задания: Объёмами грунта: $V = 1000; 2000; 3000$ м³. Марки экскаваторов: ЭО-2621, ЕК-14, ЭО-4112. Выбрать из них наиболее эффективный экскаватор для данных условий производства работ.

Таблица П.3 - Расчёт сравнительной технико-экономической эффективности применения одноковшовых экскаваторов

Наименование показателей и их обозначение	Единица измерения	Формула расчёта (источник получения информации)	Расчётные данные для экскаваторов		
			Экскаватор 1	Экскаватор 2	Экскаватор 3
Объём грунта (V)	м ³	Исходные данные			
Эксплуатационная часовая производительность (П _{э.ч.})	м ³ /ч	Справочные данные			
Продолжительность механизированных работ (Т _м)	ч	$T_m = \frac{V}{P_{э.ч.}}$			
Себестоимость машино-часа (С _{м.ч.})	руб./ч	Справочные данные			
Расходы по эксплуатации экскаваторов	руб.	$P_э = C_{м.ч.} \cdot T_m$			
Себестоимость земляных работ	руб.	$C_з = P_э \cdot K_n$; к _н - коэффициент накладных расходов			
Приведённые затраты	руб.	$Z_{пр} = C_з + E_n \cdot \frac{T_m}{T_\Gamma} \cdot K$; где E _н – коэффициент сравнительной экономической эффективности, Т _Г – число часов работы экскаватора в году, (дни). К - капитальные затраты			

Задание 6. Рассчитать основные ТЭП и выбрать рациональную область использования скрепера. На основании индивидуального задания произвести расчёт основных технико-эксплуатационных показателей скрепера, представить графическую циклограмму работы скрепера. Построить графические зависимости: $P_{э.ч.}=f(\ell_{mp})$, $N_{y\partial}=f(\ell_{mp})$, $G_{y\partial}=f(\ell_{mp})$, $Z_{пр}=f(\ell_{mp})$ и на основании анализа зависимостей определить область рационального использования скрепера. Пример индивидуального задания: Марка скрепера - ДЗ-35711. Вырабатываемый объем -15000 куб. м. Дальность транспортирования грунта: ℓ_{mp} =800, 1600, 2400 м. Работа производится с грунтом II категории.

Задание 7. Выбор и комплектование машин для уплотнения грунтов. Используя исходные данные согласно индивидуальному заданию, произвести выбор типа и параметров уплотняющей машины. Привести схему выбранной машины и ее параметры. Осуществить расчёт производительности выбранной машины. Рассчитать требуемый темп работ. Определить требуемое количество машин по формуле. Пример индивидуального задания: Вид уплотняемого материала - глинистый грунт. Ширина полосы уплотняемого материала, B=20 м. Толщина уплотняемого слоя материала $h_{сл}$ =0,5 м.

Задание 8. Выбрать свайный молот и копровое оборудование. Требуется: подобрать марку молота, необходимого для погружения сваи до проектной отметки. Пример индивидуального задания: Свая сплошного сечения квадратная: масса сваи m_c = 10,0

т; размер стороны сечения $d_c = 0,4$ м; масса наголовника $m_H = 0,5$ т; несущая способность сваи $F_d = 2500$ кН; расчетная вертикальная нагрузка на сваю $N = 1350$ кН; контрольный остаточный отказ сваи $S_a = 0,001$ м.

Задание 9. Выбрать вибропогружатель для погружения свай. Требуется: подобрать тип вибропогружателя для погружения свай в нескальный грунт. Пример индивидуального задания: Сваю-оболочку диаметром $d = 1,2$ м и длиной $l = 20$ м необходимо погрузить в пески мелкие, средней плотности, влажные. Несущая способность сваи по грунту $F_d = 2500$ кН. Свая погружается с извлечением грунта из полости.

Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на шестой семестр:

Задание 1. Определение объемов работ при устройстве монолитных железобетонных фундаментов. Определить объемы работ по устройству опалубки, объемы арматурных работ, объемы работ по укладке и уплотнению бетонной смеси, объемы работ по распалубованию монолитной железобетонной конструкции. Составить ведомость объемов работ (таблица П.4).

Таблица П.4 – Ведомость объемов работ

№ п/п	Обоснование ГЭСН	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ (количество ед. изм.)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Задание 2. Запроектировать опалубку монолитной железобетонной конструкций. Согласно заданию 1 выполнить подбор опалубочной системы и составить спецификацию опалубочной системы. Представить схему установки опалубочной системы. Пример индивидуальное задание: Запроектировать опалубку монолитной фундаментной плиты размерами в плане $44,0 \times 20,0$ м и толщиной 1 м.

Задание 3. Выбрать и комплектовать бетоносмесительное оборудование. Согласно индивидуальному заданию, рекомендуемых справочных данных произвести расчёт и подбор комплекта бетоносмесительного оборудования. Пример индивидуального задания: Годовая производительность - 38000 м³. Режим работы – циклический. Количество смен – 1. Подвижность смеси – подвижная.

Задание 4. Выбрать и комплектовать бетононасос. Согласно индивидуальному заданию, рекомендуемых справочных данных произвести расчёт и выбрать оптимальный тип бетононасоса осуществить по минимальной величине приведённых затрат при различных объёмах бетонных работ. Построить функции: $Z_{np} = f(V)$ и $Z_{np.уд.} = f(V)$, по которым определить наиболее оптимальный тип бетононасоса. Пример индивидуального задания: бетононасосы С-252 и С-284А. Объёмы работ $V = 1; 2,5; 4$ тыс.м³.

Задание 5. Выбрать и комплектовать автобетоносмесители. Согласно индивидуальному заданию, рекомендуемых справочных данных произвести расчёт и подбор комплекта

автобетоносмесителей для конкретных условий работы. Пример индивидуального задания: Объем подачи – 45 куб.м./ч. Тип дороги – щебеночная. Дальность возки автобетоносмесителем – 25 км.

Задание 6. Определить объемы каменных работ и определить количество строительных материалов. Требуется подсчитать объемы работ и количество строительных материалов кирпичных стен многоэтажного здания (1-3 этажа), состоящего из одной или четырех секций при следующих исходных данных:

- высота этажа $h = 2,8$ м;
- кладка наружных стен толщиной в два кирпича средней сложности производится под расшивку;
- кладка внутренних стен толщиной в 1 и 1,5 кирпича производится в пустошовку;
- продолжительность кладки одного этажа $t = 4$ смены;
- для монтажных работ и подачи материалов используется башенный или самоходный кран грузоподъемностью до 5 т;
- работы ведутся поточным методом в две – три смены комплексной бригадой каменщиков и специализированной бригадой монтажников;
- масса монтируемых лестничных маршей и площадок составляет 0,64–0,93 т, плит перекрытий – 3,5 т;
- на 1 м^3 кладки расходуется 380 кирпичей и $0,25 \text{ м}^3$ раствора;
- план типового этажа приведен на рисунке П.4 и состоит из двух торцевых и 0 – 2 средних секций в зависимости от варианта задания;
- каждая секция имеет по фасаду здания пять оконных проемов, крайние секции – по одному окну с торца здания – 2-й этаж, 1-й этаж – с торца здания – входные двери.

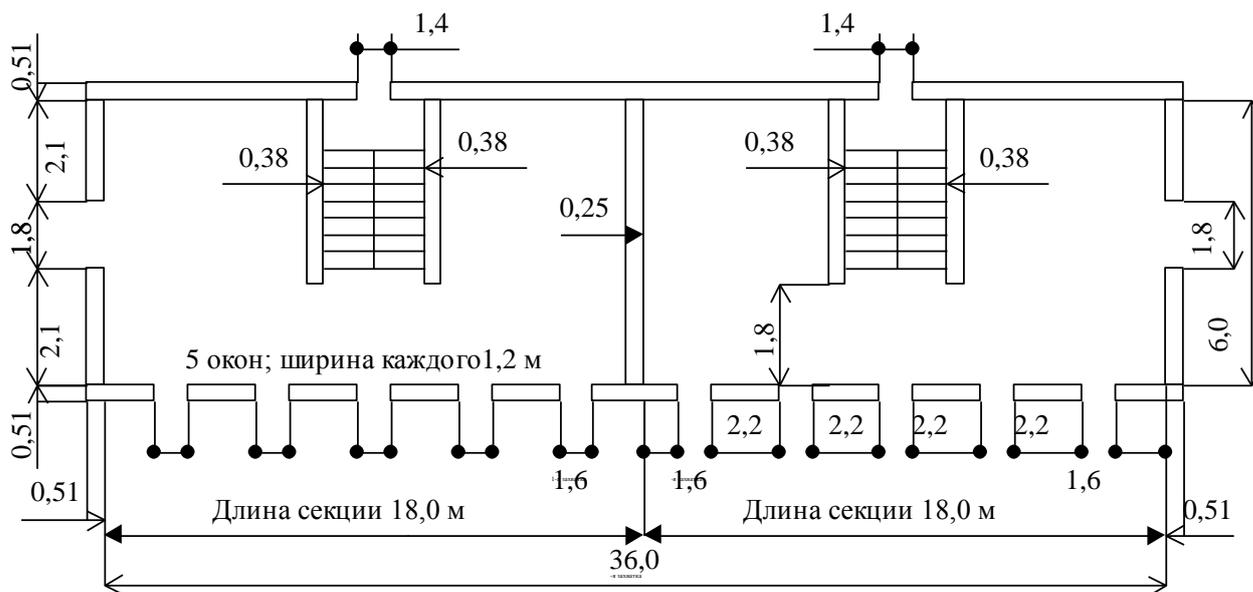


Рисунок П.4 - План типового этажа

Подсчет объемов работ по кирпичной кладке для типового этажа оформить в таблице П.5.

Таблица П.5 – Объёмы кирпичной кладки для типового этажа

Наименование работ	Площадь стен, м^2	Площадь проемов, м^2		Площадь за вычетом проемов, м^2	Объем кладки, м^3
		окон	дверей		
Итого на 1 этаж					
Итого на все здание					

Пример индивидуального задания: Количество этажей – 2. Количество секций – 2. Длина секций – 18. Ширина оконных проемов – 1,6 м. ширина дверных проемов – 1,8 м. Высота оконных проемов – 1,4 м. Высота дверных проемов – 2,21 м.

Задание 7. Определить трудовые затраты бригады каменщиков. Подсчет затрат труда на производство каменной кладки произвести на основании данных строительных норм (ГЭСН, ЕНиР). Результаты свести в таблицу П.6.

Таблица П.6 – Затраты труда на производство каменной кладки

Наименование работ	Нормативный источник	Объем кладки, м ³	Норма времени, чел.-ч	Нормативная трудоемкость	
				чел.-ч	чел.-см.
Итого на 1 этаж					
Итого на все здание					

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных в задании 6.

Задание 8. Определить состав бригады каменщиков и их размещение на захватке. Исходя из размера типового этажа, разбить его на захватки и яруса. Исходя из заданного срока кладки этажа, продолжительности работы на одном ярусе-захватке определить сменный состав каменщиков в бригаде. Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных в заданиях 6, 7.

Задание 9. Для обеспечения поточности ведения каменных работ определить количество звеньев и каменщиков в них и длину делянки каждого звена. Из учета толщины наружных и внутренних стен подобрать рациональный состав звеньев каменщиков. Из удельного объема каменной кладки каждого звена определить количество звеньев исходя из общего состава бригады каменщиков. Определить длину делянки на одну смену для каждого звена. По полученным расчетным данным построить схему членения захватки на делянки. Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных в заданиях 6, 7, 8.

Задание 10. Определить объемы монтажных работ и количество строительных конструкций (перемычек, плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей и площадок). Требуется подсчитать объемы работ и количество строительных конструкций.

Подсчет объемов монтажных работ для типового этажа оформить в таблицу П.7.

Таблица П.7 – Спецификация сборных конструкций

№ п/п	Наименование сборных элементов конструкций	Марка элемента	Размеры, мм			Масса одного элемента, т	Потребное количество, шт.		Общая масса конструкций, т
			длина	ширина	высота		на захватку	на все здание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных в задании 6.

Задание 11. Подбор монтажного крана по рабочим параметрам для возведения многоэтажного кирпичного здания. Определить рабочие параметры крана (грузоподъемность, высота подъема крюка крана, требуемый вылет крюка крана) исходя из габаритов здания.

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных в заданиях 6, 10.

Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на седьмой семестр:

Задание 1. Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ. При выполнении задания решить следующие вопросы:

- составить ведомость работ, и определяются их объемы;
- выбирать и обосновывать возможные способы производства земляных работ;
- составить комплекты машин и механизмов (варианты), необходимые для производства земляных работ;
- рассчитать требуемые рабочие параметры машин и механизмов по каждому варианту производства земляных работ;
- составить калькуляцию машиноёмкости и продолжительности основных видов земляных работ для каждого варианта;
- произвести технико-экономическое сравнение вариантов и выбрать оптимальный вариант;
- разработать календарный график производства земляных работ;
- определить технико-экономические показатели выбранного варианта;
- произвести краткое описание технологических решений по видам работ;
- разработать технические решения по безопасности производства работ.

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении заданий 1-3 в пятом семестре данной дисциплины.

Задание 2. Разработка элементов технологической карты на совмещенное производство каменных и монтажных работ. При выполнении задания решить следующие вопросы:

- подсчитать объемы работ и затраты труда по возведению многоэтажного кирпичного здания;
- определить параметры строительного потока и состава рабочих бригад;
- организовать рабочее место каменщика (подмости, инструмент и приспособления);
- рассмотреть вопросы по охране труда при производстве работ по каменной кладке;
- запроектировать технологическую карту отражающую процесс производства кладки и установки сборных железобетонных конструкций. На плане необходимо указать: разбивку здания на захватки и делянки; расположение кранов, направление их перемещения, привязку к осям здания; расположение площадок перегрузки раствора, складов кирпича, железобетонных элементов и их привязку к осям здания. На разрезе должны быть показаны: подмости, с которых ведется кладка, их привязка к осям здания; кран с привязкой к осям здания; козырьки; склад кирпича или автомашина, с которой кирпич поднимают на подмости; монтаж плит перекрытия и покрытия, лестничных маршей и площадок. Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении заданий 6-9 в шестом семестре данной дисциплины.

Тематика самостоятельной работы на практических занятиях по индивидуальным заданиям на восьмой семестр:

Задание 1. Запроектировать график потребности строительных материалов, конструкций и полуфабрикатов. На основании графика производна работ и ведомости потребности в строительных материалах построить график потребности в материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях в форме таблицы П.8.

Таблица П.8 - Форма графика поступления на объект строительных конструкций, материалов и оборудования

№ п/п	Наименование строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования	Единица измерения	Количество	График поступления по дням, неделям, месяцам
1	2	3	4	5

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении задание 2 в седьмом семестре данной дисциплины.

Задание 2. Составить ведомость потребности основных и вспомогательных машин и механизмов. На основании графика производна работ, составить ведомость потребности основных и вспомогательных машин и механизмов в форме таблицы П.9.

Таблица П.9 - Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах

Наименование машины, марка	Количество	Мощность установленных двигателей, кВт	Пребывание на объекте строительства по календарному плану	
			Начало	Конец
1	2	3	4	5

Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении задание 2 в седьмом семестре данной дисциплины.

Задание 3. Произвести привязку башенного крана к зданию без подвала и с подвалом без расчета выдавливания стен от крановой нагрузки. Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении задание 2 в седьмом семестре данной дисциплины.

Задание 4. Произвести привязку стрелового крана к зданию без подвала и с подвалом без расчета выдавливания стен от крановой нагрузки. Пример индивидуального задания: Задание выполняется на основании данных полученных при выполнении задание 2 в седьмом семестре данной дисциплины.

Задание 5. Произвести поперечную привязку рельсового крана у откоса котлована. Пример индивидуального задания: Размеры земляного сооружения - котлована (длина – 30,0 м; ширина – 15,0 м; глубина – 2,5 м). Грунт - суглинок. Монтажный кран – КБ-405.

Задание 6. Произвести установку крана для опускания (подъема) грузов ниже стоянки крана. Определить требуемую глубину опускания от отметки установки грузоподъемного крана до уровня земли при производстве кровельных работ. Пример индивидуального задания: Высота здания от уровня земли до уровня покрытия – 30,0 м. Кран стреловой "Пионер" КПМ г/п-500 кг. Высота груза – 1,2 м. Высота строповки – 2,0 м.

Задание 7. Произвести привязку грузоподъемного крана внутри строящегося или реконструируемого здания. Привязку грузоподъемного крана внутри здания произвести с учетом допустимых габаритов приближения кранов или перемещаемых грузов к конструкциям здания. Пример индивидуального задания: Одноэтажное промышленное здание пролетом – 24,0 м. Высота этажа – 18,0 м. Грузоподъемный кран - КС-55713-5К-2. Габариты груза – 5,0×1,5×1,5 м. отметка установки груза - +4,500.

Задание 8. Определить границы зон работы крана с учетом:

- стесненности строительной площадки в условиях городской застройки;
- стесненности строительной площадки в условиях действующего предприятия;

- ограничения зон обслуживания крана;
- охранной зоны линии электропередачи.

Пример индивидуального задания: Определить зоны работы крана с учетом ограничения зоны обслуживания. Определить опасные зоны работы крана и здания. Представить схему действия системы ограничения зон работы монтажного крана. Данные по привязки монтажного крана к зданию брать из заданий 5-6. Схема расположения возводимого здания представлена на рисунке П.5.

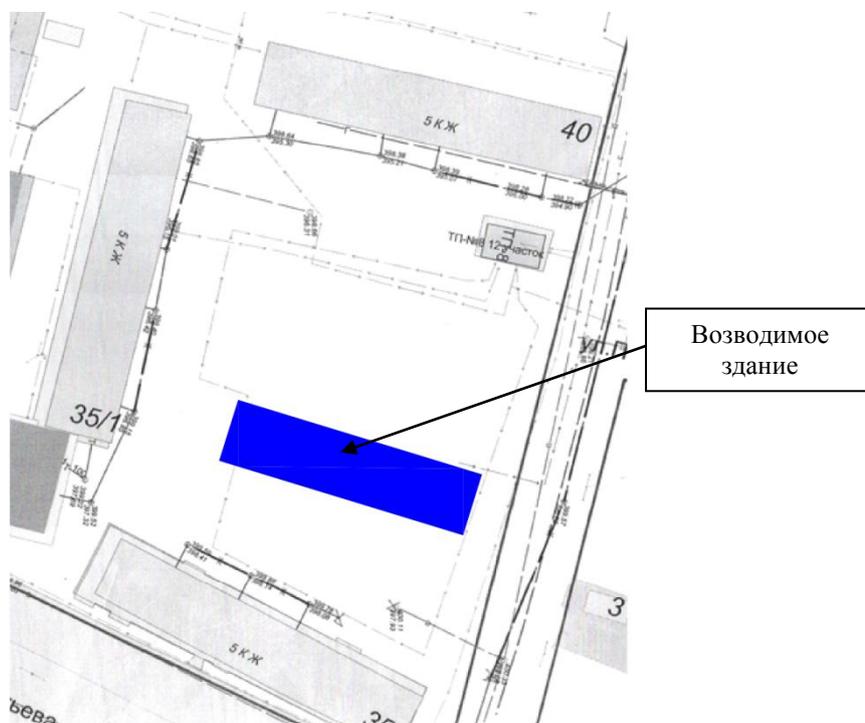


Рисунок П.5 – Схема расположения возводимого здания

Задание 9. Расчет площадей и отображение на плане временных складов открытого хранения строительных конструкций и материалов. С учетом графика потребности в материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях определить среднесуточную потребность. Исходя из величины нормированного запаса материалов, видов транспортных средств, нормами складирования на 1 м^2 площади склада, привязки монтажного крана и размерами строительной площадки произвести расчет и отобразить на плане временных складов открытого хранения. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-8 произвести расчет площадей и отображение на плане временных складов открытого хранения строительных конструкций и материалов на период возведения наземной части здания.

Задание 10. Расчет площадей и выбор типовых временных зданий и сооружений, отобразить их на плане. На основании графика производства работ и принятого количественного состава комплексной бригады по возведению наземной части здания построить график движения рабочих. По графику движения рабочих, наиболее напряженный период строительства, определить численность рабочих основного производства. Определить удельный вес рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала, пожарно-сторожевой охраны в зависимости от показателей конкретной строительной отрасли. Рассчитать требуемые площади временных зданий (административного, санитарно-бытового назначения) с учетом норм площади на одного работающего. Составить экспликацию инвентарных зданий административного, санитарно-бытового назначения с учетом расчетных площадей временных зданий. Запроектировать строительный городок на участке ведения работ с учетом требований охраны труда и пожарной безопасности. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-9 произвести расчет площадей и выбор типовых временных зданий и сооружений, отобразить их на плане.

Задание 11. Проектирование и отображение временных дорог и подъездных путей на строительной площадке. Выполнить проектирование временных дорог и подъездных путей на строительной площадке в следующем порядке:

- изучить проектируемые постоянные транспортные коммуникаций, существующее сети дорог на территории строительства и подъездные пути с целью максимального использования их при проектировании сети построечных дорог;
- разработать схемы движения транспорта;
- произвести трассировку и ограждение параметров временных дорог, выявление опасных зон для установки знаков движения на стройгенплане;
- выбрать экономичный вариант конструкций временных дорог.

Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-10 произвести проектирование и отображение временных дорог и подъездных путей на строительной площадке.

Задание 12. Расчет потребности во временном электроснабжении, трассировка силовых и осветительных электросетей, нанесение на план пунктов электропитания. С учетом исходных данных для организации временного электроснабжения (виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, типы строительных машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность автодорог, площадь территории строительства и сменность работ) определить расчетную трансформаторную мощность при одновременном потреблении электроэнергии группой потребителей с максимальной суммарной мощностью. Подобрать временную трансформаторную подстанцию и сечение временной электросети для нужд строительства.

Проектирование электроснабжения осуществлять в следующем порядке:

- выявление потребителей и определение их мощности;
- определение календарных сроков потребления электроэнергии различными потребителями;
- определение суммарной мощности потребителей электроэнергии, календарные сроки, действия которых совпадают, выявление группы потребителей с наибольшей суммарной мощностью;
- расчет требуемой мощности трансформатора и его выбор;
- расчет сечения проводов воздушной временной электросети;
- проектирование схемы электросети.

Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-11 произвести расчет потребности во временном электроснабжении, трассировка силовых и осветительных электросетей, нанесение на плане строительной площадке пунктов электропитания.

Задание 13. Расчет потребности во временном водоснабжении, отображение на плане сетей временного водопровода и канализации. С учетом исходных данных для определения потребности в воде (принятые методы производства работ, их объемы и сроки выполнения) произвести расчет потребности во временном водоснабжении на производственные, хозяйственно-бытовые нужды, а также на случай тушения пожара в период максимального водопотребления. Определить необходимый диаметр временного водопровода и подобрать сечения труб по сортаменту. На строительном генеральном плане запроектировать схему временного водоснабжения и канализации. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-12 произвести расчет потребности во временном водоснабжении, отображение на плане сетей временного водопровода и канализации.

Задание 14. Разработка мероприятий для безопасного производства работ. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-13 разработать мероприятия по охране труда в период возведения наземной части здания.

Задание 15. Разработка проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-14 разработать мероприятия по охране окружающей среды в период возведения наземной части здания.

Задание 16. С учетом полученных результатов в заданиях 1-15 вычертить строительный генеральный план. Пример индивидуального задания: С учетом данных полученных при выполнении заданий 1-15 вычертить строительный генеральный план на период возведения наземной части здания.

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям (занятия в форме интерактивного обучения):

Тема 1. Составление баланса земляных масс.

Тема 2. Выбор и комплектование машин для уплотнения грунтов.

Тема 3. Выбор рационального комплекта машин при выполнении земляных работ.

Тема 4. Выбор рационального комплекта машин при выполнении свайных работ.

Тема 5. Подбор опалубочных систем для различных монолитных железобетонных конструкций.

Тема 6. Выбор машин и механизмов для бетонирования монолитных железобетонных конструкций.

Тема 7. Проектирование поточного производства бетонных работ.

Тема 8. Проектирование поточного производства каменных работ.

Тема 9. Предварительный выбор вариантов производства монтажных работ исходя из принимаемого монтажного крана.

Тема 10. Разбивка здания на монтажные участки (захватки).

Тема 11. Выбор захватных и вспомогательных приспособлений.

Тема 12. Проектирование склада конструкций.

Тема 13. Элементов технологической карты на производство земляных работ.

Тема 14. Элементы технологической карты на производство свайных работ.

Тема 15. Элементов технологической карты на производство каменных работ.

Тема 16. Элементов технологической карты на производство бетонных работ.

Тема 17. Элементов технологической карты на производство монтажных работ.

Тема 18. Элементов технологической карты на производство кровельных работ.

Тема 19. Элементов технологической карты на производство отделочных работ.

Тема 20. Проектирование графика потребности строительных материалов, конструкций и полуфабрикатов.

Тема 21. Проектирование графика потребности основных и вспомогательных машин и механизмов.

Тема 22. Нанесение на план строительных кранов с указанием зон их действия и опасных зон.

Тема 23. Расчет площадей и отображение на плане временных складов открытого хранения строительных коммуникаций и материалов.

Тема 24. Расчет площадей и выбор типовых временных зданий и сооружений, отображение их на плане.

Тема 25. Проектирование и отображение сети временных подъездных путей на строительной площадке.

Тема 26. Расчет потребности во временном электроснабжении, трассировка силовых и осветительных электросетей, нанесение на план пунктов электропитания.

Тема 27. Расчет потребности во временном водоснабжении, отображение на плане сетей временного водопровода и канализации.

Тема 28. Разработка мероприятий для безопасного производства работ.

Тема 29. Разработка проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

Тема 30. Расчет технико-экономических показателей строительного генерального плана.

Приложение 2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений		
УК-2.1	Определяет круг задач в рамках поставленной цели и предлагает способы их решения и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта.	<p>Перечень теоретических вопросов к зачетам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пояснить технологический процесс работы бульдозеров. Привести схемы разработки грунта. 2. Как рассчитать эксплуатационную часовую производительность бульдозера. 3. Как определить продолжительность рабочего цикла бульдозера. 4. Как рассчитать удельные затраты работы бульдозеров. 5. На чём основывается выбор рациональной области использования бульдозера. 6. Привести схемы лобовых проходок одноковшовых экскаваторов с отгрузкой в автотранспорт. 7. Привести схемы поперечно-торцовых проходок одноковшовых экскаваторов с отгрузкой в автотранспорт. 8. Привести схемы боковых проходок одноковшовых экскаваторов с отгрузкой в автотранспорт. 9. Как рассчитать производительность и потребное количество ведущих машин. 10. Как рассчитать производительность и потребное количество вспомогательных машин. 11. Пояснить расчёт времени рабочего цикла автосамосвала. 12. Как определить затраты на производство земляных работ средствами механизации. 14. Изобразить профили экскаваторных забоев. 15. Как рассчитать себестоимость земляных работ. 16. Как рассчитать приведённые затраты. 17. В чём заключается выбор наиболее эффективного экскаватора графическим методом. 18. Привести схемы движения скреперов при производстве работ. 19. Пояснить расчёт эксплуатационной производительности скрепера.
УК-2.2	Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.	
УК-2.3	Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования.	

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>20. Как определяется время рабочего цикла скрепера.</p> <p>21. Как определить время заполнения и время разгрузки ковша скрепера.</p> <p>22. На каких показателях основана оценка эффективности работы скрепера.</p> <p>23. Дать характеристику укатки.</p> <p>24. Как осуществляется процесс трамбовки.</p> <p>25. В чём особенности виброуплотнения.</p> <p>26. Где используются пневмоколёсные катки.</p> <p>27. Как осуществляется процесс уплотнения кулачковыми катками.</p> <p>28. В каких случаях используются катки с гладкими вальцами.</p> <p>29. Охарактеризовать область применения вибрационных катков.</p> <p>30. На чём основан эффект уплотнения трамбовочных машин.</p> <p>31. Дать характеристику технологических схем при уплотнении материалов.</p> <p>32. Как определить часовую эксплуатационную производительность пневмоколёсных катков.</p> <p>33. Как осуществить выбор кулачковых катков.</p> <p>34. Как рассчитать потребное количество проходов кулачковых катков.</p> <p>35. Как определить часовую эксплуатационную производительность катков с гладкими вальцами.</p> <p>36. В чём заключается методика расчёта вибрационных катков.</p> <p>37. Как рассчитать массу трамбуемой плиты.</p> <p>40. Как определить необходимое количество проходов трамбуемых машин.</p> <p>41. Пояснить расчёт затрат комплектами машин.</p> <p>42. Как осуществить выбор оптимального варианта комплекта машин.</p> <p>43. Изобразите схему проведения бетонных работ.</p> <p>44. Какие виды бетоносмесителей используются для приготовления бетона.</p> <p>45. Поясните роль бетоносмесителей в приготовлении бетона, с какими компонентами смеси он работает.</p> <p>46. Как рассчитать производительность бетоносмесителей непрерывного действия.</p> <p>47. На чём основана методика подбора бетоносмесителей периодического действия.</p> <p>48. Какие средства механизации на базе грузовых автомобилей используются для</p>

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>транспортирования бетонных смесей.</p> <p>49. Пояснить назначение автобетоносмесителей в общей схеме приготовления бетонов.</p> <p>50. Как определяется производительность автобетоносмесителя.</p> <p>51. Из каких операций состоит рабочий цикл автобетоносмесителя.</p> <p>52. Как определить необходимое количество автобетоносмесителей.</p> <p>53. Виды бетононасосов и их назначение.</p> <p>54. Каким образом осуществляется подача бетонной смеси бетононасосами к месту её укладки.</p> <p>55. Как определяется себестоимость полного объёма бетонных работ.</p> <p>56. Как определяются удельные приведённые затраты при выполнении бетонных работ.</p> <p>57. Какие затраты относятся к переменным и условно – постоянными.</p> <p>58. Какой комплект работ выполняется при монтаже сооружений.</p> <p>59. Какие средства механизации используются для монтажных работ.</p> <p>60. Охарактеризовать зоны работы монтажных кранов.</p> <p>61. Как осуществить выбор башенных кранов по техническим параметрам.</p> <p>62. Как осуществить выбор стрелового самоходного крана по техническим параметрам.</p> <p>63. Как рассчитать величину удельных приведённых затрат на 1 тонну смонтированных конструкций.</p> <p>64. Как определить нормативную сменную эксплуатационную производительность кранов.</p> <p>65. Дайте определения понятия «Комплексная механизация строительства».</p> <p>66. Что такое основной, вспомогательный и обслуживающий процессы.</p> <p>67. Перечислите специфические особенности комплексной механизации в строительстве.</p> <p>68. Назовите пять основных способов превращения исходных продуктов в готовое изделие, конструкцию, объект и т.д.</p> <p>69. Назовите основные фазы строительного производства.</p> <p>70. Перечислите основные этапы определения эффективных средств механизации.</p>

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>71. Дайте определения таким понятиям как комплект, комплекс, система и парк машин.</p> <p>72. Приведите примеры систем машин с регулярными и нерегулярными потоками.</p> <p>73. Назовите основные структуры комплексно-механизированных процессов в строительстве.</p> <p>74. Какие структуры технологических процессов наиболее часто используются в строительстве.</p> <p>75. Какие виды производительностей Вы знаете для машины, комплекта и комплекса машин.</p> <p>76. Как определяется себестоимость механизированных работ и приведенные затраты.</p> <p>77. Как определить режим работы средств механизации.</p> <p>78. Какие показатели и коэффициенты используются для оценки уровня механизации и автоматизации в строительстве.</p> <p>79. Перечислите виды и средства механизации строительных работ.</p> <p>80. Виды и содержание строительных генеральных планов.</p> <p>81. Размещение монтажных кранов и механизмов.</p> <p>82. Организация складского хозяйства и внутривозвратной дороги.</p> <p>83. Обеспечение энергией и водой.</p> <p>84. Структура материально-технической базы.</p> <p>85. Формы организации материально-технического обеспечения.</p> <p>86. Организация поставок материально-технических поставок.</p> <p>87. Унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации.</p> <p>88. Расчет состава бытового городка.</p> <p>89. Планировочные решения бытовых городков.</p> <p>90. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения.</p> <p>91. Эксплуатация бытовых городков.</p> <p>92. Генеральное и стратегическое планирование.</p> <p>93. Разработка базовой стратегии строительной организации.</p> <p>94. Текущее и оперативное планирование.</p>

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>95. Оценка рисков при принятии решений.</p> <p>Перечень разделов контрольных работ согласно индивидуальному заданию на третий курс (пример варианта индивидуального задания для выполнения представлен в Приложение 1.):</p> <p>Индивидуальные задания на пятый семестр:</p> <p>Задание 1. Составление исходных данных для проектирования производства земляных работ и расчет вертикальной планировки строительной площадки.</p> <p>Задание 2. Определить объемы планировочной выемки и насыпи.</p> <p>Задание 3. Составить баланс земляных масс.</p> <p>Задание 4. Рассчитать ТЭП и выбрать рациональную область использования бульдозера.</p> <p>Задание 5. Рассчитать ТЭП и выбрать оптимальный тип экскаватора.</p> <p>Задание 6. Рассчитать основные ТЭП и выбрать рациональную область использования скрепера.</p> <p>Задание 7. Выбор и комплектование машин для уплотнения грунтов.</p> <p>Задание 8. Выбрать свайный молот и копровое оборудование.</p> <p>Задание 9. Выбрать вибропогружатель для погружения свай.</p> <p>Индивидуальные задания на седьмой семестр:</p> <p>Задание 1. Определение объемов работ при устройстве монолитных железобетонных фундаментов.</p> <p>Задание 2. Запроектировать опалубку монолитной железобетонной конструкций.</p> <p>Задание 3. Выбрать и комплектовать бетоносмесительное оборудование.</p> <p>Задание 4. Выбрать и комплектовать бетононасос.</p> <p>Задание 5. Выбрать и комплектовать автобетоносмесители.</p> <p>Задание 6. Определить объемы каменных работ и определить количество строительных материалов.</p> <p>Задание 7. Определить трудовые затраты бригады каменщиков.</p> <p>Задание 8. Определить состав бригады каменщиков и их размещение на захватке.</p> <p>Задание 9. Для обеспечения поточности ведения каменных работ определить</p>

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>количество звеньев и каменщиков в них и длину делянки каждого звена.</p> <p>Задание 10. Определить объемы монтажных работ и количество строительных конструкций (перемычек, плит перекрытий и покрытий, лестничных маршей и площадок).</p> <p>Задание 11. Подбор монтажного крана по рабочим параметрам для возведения многоэтажного кирпичного здания.</p> <p>Перечень разделов контрольных работ согласно индивидуальному заданию на четвертый курс (пример варианта индивидуального задания для выполнения представлен в Приложение 1.):</p> <p>Индивидуальные задания на седьмой семестр:</p> <p>Задание 1. Разработка элементов технологической карты на производство земляных работ.</p> <p>Задание 2. Разработка элементов технологической карты на совмещенное производство каменных и монтажных работ.</p> <p>Индивидуальные задания на восьмой семестр:</p> <p>Задание 1. Запроектировать график потребности строительных материалов, конструкций и полуфабрикатов.</p> <p>Задание 2. Составить ведомость потребности основных и вспомогательных машин и механизмов.</p> <p>Задание 3. Произвести привязку башенного крана к зданию без подвала и с подвалом без расчета выдавливания стен от крановой нагрузки.</p> <p>Задание 4. Произвести привязку стрелового крана к зданию без подвала и с подвалом без расчета выдавливания стен от крановой нагрузки.</p> <p>Задание 5. Произвести поперечную привязку рельсового крана у откоса котлована.</p> <p>Задание 6. Произвести установку крана для опускания (подъема) грузов ниже стоянки крана.</p> <p>Задание 7. Произвести привязку грузоподъемного крана внутри строящегося или реконструируемого здания.</p> <p>Задание 8. Определить границы зон работы крана с учетом:</p>

Код индикатора	Индикатор достижения	Оценочные средства
		<p>- стесненности строительной площадки в условиях городской застройки;</p> <p>- стесненности строительной площадки в условиях действующего предприятия;</p> <p>- ограничения зон обслуживания крана;</p> <p>- охранной зоны линии электропередачи.</p> <p>Задание 9. Расчет площадей и отображение на плане временных складов открытого хранения строительных конструкций и материалов.</p> <p>Задание 10. Расчет площадей и выбор типовых временных зданий и сооружений, отобразить их на плане.</p> <p>Задание 11. Проектирование и отображение временных дорог и подъездных путей на строительной площадке.</p> <p>Задание 12. Расчет потребности во временном электроснабжении, трассировка силовых и осветительных электросетей, нанесение на план пунктов электропитания.</p> <p>Задание 13. Расчет потребности во временном водоснабжении, отображение на плане сетей временного водопровода и канализации.</p> <p>Задание 14. Разработка мероприятий для безопасного производства работ.</p> <p>Задание 15. Разработка проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.</p> <p>Задание 16. С учетом полученных результатов в заданиях 1-15 вычертить строительный генеральный план.</p> <p>Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запроектировать технологические схемы по производству земляных, свайных работ и работ по устройству монолитных железобетонных строительных конструкций. 2. Разработать элементы технологических карт на производство земляных и каменных работ. 3. Запроектировать общеплощадочный строительный генеральный план на период возведения многоэтажного кирпичного дома в условиях существующей городской застройки.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектная деятельность» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в письменной форме по двум теоретическим вопросам.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку **«отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку **«хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
